



寒工高改築工事かわら版

第32号

工事についてお気づきの点がございましたら、右記にご連絡ください。

グラウンド工事の段取りを開始しました



今年も残り10日程になり、無事に年末年始を迎えられそうでホッとしています。また、本年も学校の皆さま並びに近隣の皆さまにご協力頂き、順調に工事が進められたことに御礼申し上げます。ありがとうございます。

さて、現場の方は今月で解体工事が完了できるかなと見ていましたが、なかなか難しく来月まで解体作業が掛かりそうです。ただし、解体作業が完了したところから、グラウンドの路床の整正作業を開始しました。

解体による騒音や振動、また、材料の搬出や搬入の大型車両の出入りが続きますが、安全に工事を進めて参りますので、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

(左写真) R6.11.26南側上空より

◆解体工事の施工状況

建屋の解体工事状況は、上部躯体の解体が完了し、基礎の解体が残り3棟になりました。建物の解体が完了した後を追いかけて、埋設配管や構内の舗装の撤去を行っています。まもなく解体工事の完了します。最後まで、ご安全に！



上部躯体の解体は完了です。



基礎、土間も縁切りしながら慎重に解体していきます。



周囲を掘削してから基礎を解体していきます。解体中は、粉じんの飛散防止も忘れずに。




◆グラウンドの概要

新グラウンドには、野球場、サッカーコート、陸上トラック、テニスコート、ハンドボールコートが整備されます。

メインのグラウンドの外周は、野球場側に高さ15mの防球ネットを、またサッカーコート側は高さ8mの防球ネットを設置し、ネットの外周にはランニングコースを設けます。テニス、ハンドコート外周にも高さ3mの防球フェンスを設置します。

防球ネット、フェンスの下部2mの高さまでは防砂ネットを設置予定です。

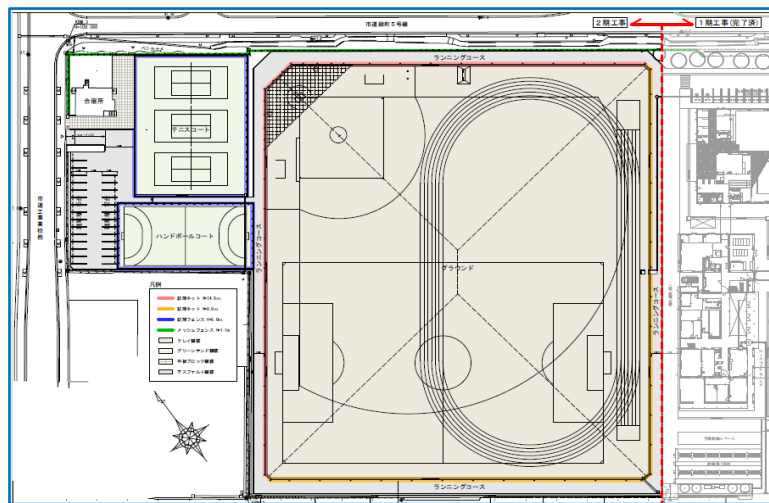

「季節性感染症」に注意！

インフルエンザやコロナウィルスなど冬に流行が拡大します。年末年始の忙しい時期は特にかからないように、うつさないように注意しましょう。

咳やくしゃみは約3メートルも飛ぶ！



★予防対策

- 十分な睡眠で抵抗力を落とさない
- うがい、手洗いも有効です
- 部屋の加湿も効果的です
- ワクチン接種も有効です。

工事期間中は、安全を最優先に工事を進めて参りますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。



12～1月の工事予定

- 12/継続～1/末 基礎解体、舗装、埋設物解体工事
- 12/継続～1/中 合宿所改修工事
- 12/継続 グラウンド路床工事
- 12/28～1/5 年末年始休業

※上記予定は、天候等によりズレが生じる場合があります。
